

Månedlig prosjektstyringsrapport

4-ukers rapportmal for baseline, opptjent verdi, avvik, risiko og S-kurve-rapportering

Prosjekt	Nye Hædda Barneskole	Rapporteringsmåned	September 2025
Prosjektleder	Gruppe Gruppe 4.5	Statusdato	30.09.2025
Sponsor / kunde	Hædda kommune (kommunestyret)	Rapportversjon	v1.0
Utarbeidet av	Prosjektledelsen, Nye Hædda Barneskole	Valuta	kr
Overordnet status	Grønn	Distribusjon	Byggekomiteen, prosjekteier, byggherreombud, teamledere

1. Hoved-KPI-er

Ved statusdato 30.09.2025 (slutten av September 2025) har prosjektet et opptjent verdi (EV) på 272.4 MNOK (34.1 % av BAC på 800 MNOK), med en faktisk kostnad (AC) på 273.6 MNOK og planlagt verdi (PV) på 274.3 MNOK. CPI på 0.996 viser at prosjektet er marginalt over budsjett (akseptabelt), mens SPI på 0.993 viser at prosjektet er marginalt bak plan (innenfor toleranse). Estimert sluttcost (EAC) er 803.4 MNOK, som gir en variance at completion (VAC) på -3.4 MNOK mot vedtatt BAC. Overordnet status: Grønn.

KPI-sammendrag for hele prosjektet

KPI	Verdi	KPI	Verdi
BAC	800 000 000 kr	PV (kum.)	274 266 667 kr
EV (kum.)	272 450 000 kr	AC (kum.)	273 600 000 kr
CPI	0.996	SPI	0.993
EAC	803 376 766 kr	ETC	529 776 766 kr
VAC	-3 376 766 kr	Godkjent risikoreserve / tidsbuffer	50 000 000 kr / 8 uker
Brukt / gjenværende risikoreserve	Brukt 6 000 000 kr / Gjenværende 44 000 000 kr	Brukt / gjenværende tidsbuffer	Brukt 0.0 uker / Gjenværende 8.0 uker

KPI-visning per milepæl

Milepæl / arbeidsstrøm	BAC	EV	AC	CPI	SPI	ETC	VAC	Status / merknad
1. Prosjektledelse og Administrasjon	25 000 000 kr	13 850 000 kr	13 908 460 kr	0.996	1.044	11 150 000 kr	-105 524 kr	På plan
2. Planlegging og Prosjektering	70 000 000 kr	70 000 000 kr	70 295 467 kr	0.996	1.000	0 kr	-295 467 kr	Ferdig

3. Forberedelse og Riving	70 000 000 kr	70 000 000 kr	70 295 467 kr	0.996	1.000	0 kr	-295 467 kr	Ferdig
4. Skolebygg – Bygningsmessige arbeider	360 000 000 kr	93 600 000 kr	93 995 082 kr	0.996	0.975	266 400 000 kr	-1 519 545 kr	På plan
5. Skolebygg – Tekniske Anlegg	150 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	150 000 000 kr	0 kr	Ikke startet
6. Utomhus og Uteområder	25 000 000 kr	25 000 000 kr	25 105 524 kr	0.996	1.000	0 kr	-105 524 kr	Ferdig
7. Inventar og Utstyr (FF&E)	70 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	70 000 000 kr	0 kr	Ikke startet
8. Overtakelse og Avslutning	30 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	30 000 000 kr	0 kr	Ikke startet

2. Baseline- og oppfølgings-Gantt-diagram

Figur 1 viser Baseline 1 (godkjent etter komprimering av 4.1 Råbygg iht. kommunestyrets vedtak NHB-2026-15) sammen med faktisk fremdrift pr. statusdato 30.09.2025. Eksporteres fra MS Project og settes inn under (Gantt — Tracking-visning med baseline + faktisk-stolper).

[FIGUR 1 — settes inn manuelt: Tracking-Gantt fra MS Project, statusdato 30.09.2025. Vis Baseline 1-stolper sammen med faktisk fremdrift. Marker statusdato med dagens linje.]

3. Avvik i perioden og hvordan de ble løst

Ingen vesentlige avvik registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan, og bruk av risikoreserve og tidsbuffer er uendret denne måneden. Tidligere registrerte hendelser følges opp iht. fastsatte frister.

ID	Avvik	Konsekvens	Løsning / korrigerende tiltak	Ansvarlig	Lukket den	Status
—	Ingen vesentlige avvik registrert i perioden	—	—	—	—	Lukket

4. Risikoer og bruk av risikobudsjettet


Brukt risikoreserve hittil: 6.0 MNOK av godkjent 50 MNOK (12.0 %). Brukt tidsbuffer hittil: 0.0 uker av godkjent 8 uker (0.0 %). Antall hendelser med registrert respons hittil: 1 (R-05). Restrisiko vurderes som håndterbar — gjenværende reserve og buffer dekker rimelig restekspose for de pakkene som fortsatt er aktive.

Risikobudsjettmåltall	Verdi	Risikobudsjettmåltall	Verdi
Godkjent reserve (kr)	50 000 000 kr	Brukt til nå	6 000 000 kr
Gjenværende reserve (kr)	44 000 000 kr	Åpne høye risikoer	2 (av registrerte)
Godkjent tidsbuffer (uker)	8 uker	Brukt tidsbuffer til nå (uker)	0.0 uker
Gjenværende tidsbuffer (uker)	8.0 uker	Risikoreserve som % av BAC	6.2 %

ID	Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak / respons	Brukt budsjett	Brukt budsjett	Status
R-05	Funn av forurenset masse under 3.2 Riving	Realisert	Høy	Risikobudsjett-uttrekk på 6,0 MNOK godkjent for miljøsanering og deponi. Forsinkelse på ca. 1 uke absorbert i slack. Hen...	6 000 000 kr	1.0 uker	Lukket (oppfølging avsluttet)

5. S-kurve og analyse av opptjent verdi

S-kurven nedenfor viser kumulativ PV, EV og AC for hele prosjektførsløpet (mnd 1–16), med statuslinje ved mnd 8 (September 2025). Prosjektet er 34.1 % fullført målt i opptjent verdi. CPI på 0.996 indikerer marginalt over budsjett (akseptabelt), og SPI på 0.993 indikerer at prosjektet er marginalt bak plan (innenfor toleranse).

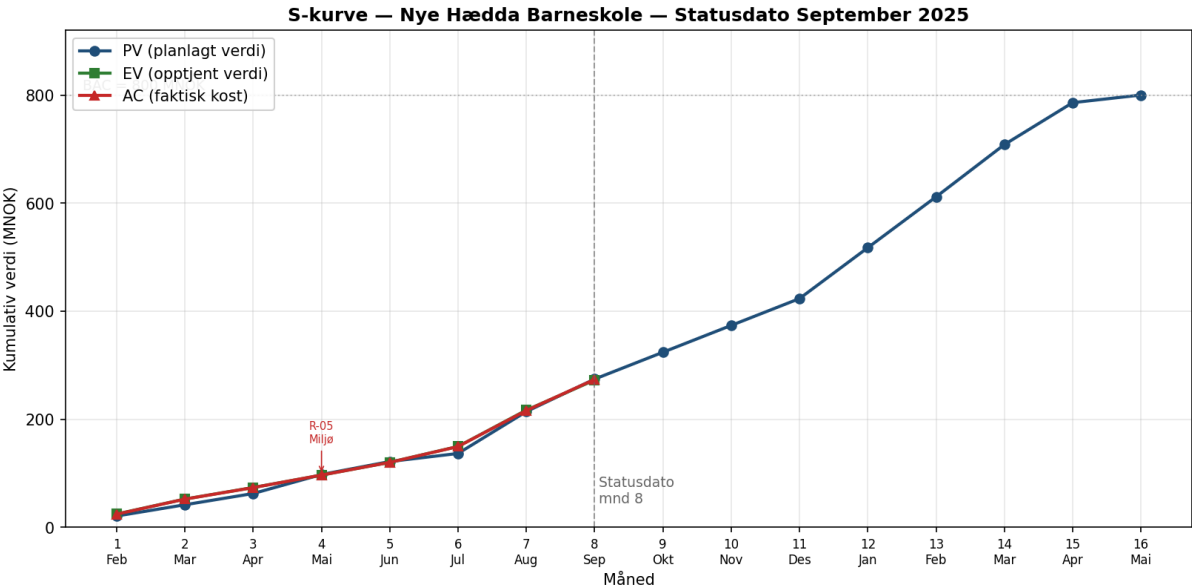

Støttende datatabell

Datatabellen under viser kumulative prosjektverdier per måned for hele forsløpet. Statusdato er markert med ← Statusdato i raden for mnd 8. Fremtidige måneder viser bare planlagt PV; EV/AC/CPI/SPI fylles ut etter hvert som statusrapportene leveres.

Måned	Periode / dato	PV kum. (kr)	EV kum. (kr)	AC kum. (kr)	CPI	SPI
Mnd 1	Februar 2025	20 825 000 kr	24 490 000 kr	24 200 000 kr	1.012	1.176
Mnd 2	Mars 2025	41 650 000 kr	52 210 000 kr	52 100 000 kr	1.002	1.254
Mnd 3	April 2025	62 475 000 kr	73 580 000 kr	73 400 000 kr	1.002	1.178
Mnd 4	Mai 2025	97 633 333 kr	96 540 000 kr	96 600 000 kr	0.999	0.989
Mnd 5	Juni 2025	121 625 000 kr	120 220 000 kr	120 100 000 kr	1.001	0.988
Mnd 6	Juli 2025	136 616 667 kr	149 540 000 kr	149 400 000 kr	1.001	1.095
Mnd 7	August 2025	214 108 333 kr	216 820 000 kr	216 100 000 kr	1.003	1.013
Mnd 8 ← Statusdato	September 2025	274 266 667 kr	272 450 000 kr	273 600 000 kr	0.996	0.993
Mnd 9	Oktober 2025	323 925 000 kr	—	—	—	—
Mnd 10	November 2025	373 583 333 kr	—	—	—	—
Mnd 11	Desember 2025	423 241 667 kr	—	—	—	—
Mnd 12	Januar 2026	517 400 000 kr	—	—	—	—
Mnd 13	Februar 2026	611 558 333 kr	—	—	—	—
Mnd 14	Mars 2026	708 216 667 kr	—	—	—	—
Mnd 15	April 2026	785 875 000 kr	—	—	—	—
Mnd 16	Mai 2026	800 000 000 kr	—	—	—	—
