

Månedlig prosjektstyringsrapport

4-ukers rapportmal for baseline, opptjent verdi, avvik, risiko og S-kurve-rapportering

Prosjekt	Nye Hædda Barneskole	Rapporteringsmåned	Februar 2026
Prosjektleder	Gruppe Gruppe 4.5	Statusdato	28.02.2026
Sponsor / kunde	Hædda kommune (kommunestyret)	Rapportversjon	v1.0
Utarbeidet av	Prosjektledelsen, Nye Hædda Barneskole	Valuta	kr
Overordnet status	Grønn	Distribusjon	Byggekomiteen, prosjekteier, byggherreombud, teamledere

1. Hoved-KPI-er

Ved statusdato 28.02.2026 (slutten av Februar 2026) har prosjektet et opptjent verdi (EV) på 638.5 MNOK (79.8 % av BAC på 800 MNOK), med en faktisk kostnad (AC) på 638.4 MNOK og planlagt verdi (PV) på 611.6 MNOK. CPI på 1.000 viser at prosjektet er innenfor budsjett, mens SPI på 1.044 viser at prosjektet er iht. plan. Estimert sluttcost (EAC) er 799.9 MNOK, som gir en variance at completion (VAC) på +0.1 MNOK mot vedtatt BAC. Overordnet status: Grønn.

KPI-sammendrag for hele prosjektet

KPI	Verdi	KPI	Verdi
BAC	800 000 000 kr	PV (kum.)	611 558 333 kr
EV (kum.)	638 456 667 kr	AC (kum.)	638 400 000 kr
CPI	1.000	SPI	1.044
EAC	799 928 995 kr	ETC	161 528 995 kr
VAC	71 005 kr	Godkjent risikoreserve / tidsbuffer	50 000 000 kr / 8 uker
Brukt / gjenværende risikoreserve	Brukt 11 000 000 kr / Gjenværende 39 000 000 kr	Brukt / gjenværende tidsbuffer	Brukt 1.5 uker / Gjenværende 6.5 uker

KPI-visning per milepæl

Milepæl / arbeidsstrøm	BAC	EV	AC	CPI	SPI	ETC	VAC	Status / merknad
1. Prosjektledelse og Administrasjon	25 000 000 kr	22 056 667 kr	22 054 709 kr	1.000	1.023	2 943 333 kr	2 219 kr	På plan
2. Planlegging og Prosjektering	70 000 000 kr	70 000 000 kr	69 993 787 kr	1.000	1.000	0 kr	6 213 kr	Ferdig

3. Forberedelse og Riving	70 000 000 kr	70 000 000 kr	69 993 787 kr	1.000	1.000	0 kr	6 213 kr	Ferdig
4. Skolebygg – Bygningsmessige arbeider	360 000 000 kr	336 900 000 kr	336 870 098 kr	1.000	1.037	23 100 000 kr	31 952 kr	På plan
5. Skolebygg – Tekniske Anlegg	150 000 000 kr	114 500 000 kr	114 489 837 kr	1.000	1.145	35 500 000 kr	13 313 kr	På plan
6. Utomhus og Uteområder	25 000 000 kr	25 000 000 kr	24 997 781 kr	1.000	1.000	0 kr	2 219 kr	Ferdig
7. Inventar og Utstyr (FF&E)	70 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	70 000 000 kr	0 kr	Ikke startet
8. Overtakelse og Avslutning	30 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	30 000 000 kr	0 kr	Ikke startet

2. Baseline- og oppfølgings-Gantt-diagram

Figur 1 viser Baseline 1 (godkjent etter komprimering av 4.1 Råbygg iht. kommunestyrets vedtak NHB-2026-15) sammen med faktisk fremdrift pr. statusdato 28.02.2026. Eksporteres fra MS Project og settes inn under (Gantt — Tracking-visning med baseline + faktisk-stolper).

[FIGUR 1 — settes inn manuelt: Tracking-Gantt fra MS Project, statusdato 28.02.2026. Vis Baseline 1-stolper sammen med faktisk fremdrift. Marker statusdato med dagens linje.]

3. Avvik i perioden og hvordan de ble løst

1 vesentlig avvik registrert i perioden, håndtert iht. risikoplan. R-06 / CR-001: Regulatorisk endring — DSB-veileder for sprinkler/rømning på 5.1 VVS. Konsekvens: 5.0 MNOK risikoreserve, 1.0 uker tidsforskyvning. Beslutning iht. møtereferat og endringsdokument. Korrigerende tiltak er iverksatt, og oppfølging skjer mot ansvarlige med fastsatte frister.

ID	Avvik	Konsekvens	Løsning / korrigerende tiltak	Ansvarlig	Lukket den	Status
ISS-13-01 (R-06 / CR-001)	Regulatorisk endring — DSB-veileder for sprinkler/rømning på 5.1 VVS	Pakke 5.1: +5.0 MNOK risikoreserve, +1.0 uker tidsforskyvning	Endringsforespørsel CR-001 godkjent. Scope justert: sprinklerdekning utvidet og rømningsskilting forsterket. Tilleggs kost 5,0 MNOK fra risikoreserve, +1 uke i installasjonssekvensen, absorbert i tidsbuffer.	Prosjektleder	14.03.2026	Lukket

4. Risikoer og bruk av risikobudsjettet


Brukt risikoreserve hittil: 11.0 MNOK av godkjent 50 MNOK (22.0 %). Brukt tidsbuffer hittil: 1.5 uker av godkjent 8 uker (18.8 %). Antall hendelser med registrert respons hittil: 3 (R-05, R-07, R-06). Restrisiko vurderes som håndterbar — gjenværende reserve og buffer dekker rimelig restekspose for de pakkene som fortsatt er aktive.

Risikobudsjettmåltall	Verdi	Risikobudsjettmåltall	Verdi
Godkjent reserve (kr)	50 000 000 kr	Brukt til nå	11 000 000 kr
Gjenværende reserve (kr)	39 000 000 kr	Åpne høye risikoer	0 (av registrerte)
Godkjent tidsbuffer (uker)	8 uker	Brukt tidsbuffer til nå (uker)	1.5 uker
Gjenværende tidsbuffer (uker)	6.5 uker	Risikoreserve som % av BAC	6.2 %

ID	Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak / respons	Brukt budsjett	Brukt budsjett	Status
R-05	Funn av forurenset masse under 3.2 Riving	Realisert	Høy	Risikobudsjett-uttrekk på 6,0 MNOK godkjent for miljøsanering og deponi. Forsinkelse på ca. 1 uke absorbert i slack. Hen...	6 000 000 kr	1.0 uker	Lukket (oppfølging avsluttet)
R-07	Brann hos vindusprodusent forsinker 4.1 Råbygg	Realisert	Middels	Tidsbuffer reduseres med 1,5 uke. Status følges opp ukentlig. Etterfølgende innvendige arbeider planlegges om for å begr...	0 kr	1.5 uker	Lukket
R-06	Regulatorisk endring — DSB-veileder for sprinkler/rømning på 5.1 VVS — endring CR-001	Realisert	Høy	Endringsforespørsel CR-001 godkjent. Scope justert: sprinklerdekning utvidet og rømningsskilting forsterket. Tilleggskos...	5 000 000 kr	1.0 uker	Aktiv — håndtert i perioden

5. S-kurve og analyse av opptjent verdi

S-kurven nedenfor viser kumulativ PV, EV og AC for hele prosjektforløpet (mnd 1–16), med statuslinje ved mnd 13 (Februar 2026). Prosjektet er 79.8 % fullført målt i opptjent verdi. CPI på 1.000 indikerer innenfor budsjett, og SPI på 1.044 indikerer at prosjektet er iht. plan.

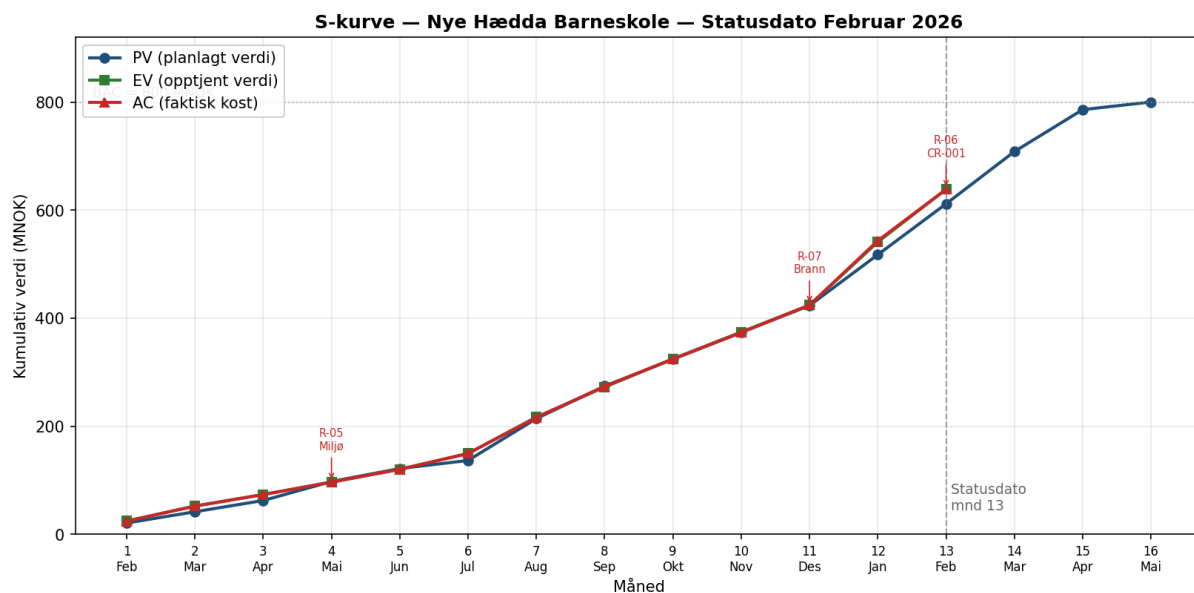

Støttende datatabell

Datatabellen under viser kumulative prosjektverdier per måned for hele forløpet. Statusdato er markert med ← Statusdato i raden for mnd 13. Fremtidige måneder viser bare planlagt PV; EV/AC/CPI/SPI fylles ut etter hvert som statusrapportene leveres.

Måned	Periode / dato	PV kum. (kr)	EV kum. (kr)	AC kum. (kr)	CPI	SPI
Mnd 1	Februar 2025	20 825 000 kr	24 490 000 kr	24 200 000 kr	1.012	1.176
Mnd 2	Mars 2025	41 650 000 kr	52 210 000 kr	52 100 000 kr	1.002	1.254
Mnd 3	April 2025	62 475 000 kr	73 580 000 kr	73 400 000 kr	1.002	1.178
Mnd 4	Mai 2025	97 633 333 kr	96 540 000 kr	96 600 000 kr	0.999	0.989
Mnd 5	Juni 2025	121 625 000 kr	120 220 000 kr	120 100 000 kr	1.001	0.988
Mnd 6	Juli 2025	136 616 667 kr	149 540 000 kr	149 400 000 kr	1.001	1.095
Mnd 7	August 2025	214 108 333 kr	216 820 000 kr	216 100 000 kr	1.003	1.013
Mnd 8	September 2025	274 266 667 kr	272 450 000 kr	273 600 000 kr	0.996	0.993
Mnd 9	Oktober 2025	323 925 000 kr	324 670 000 kr	324 300 000 kr	1.001	1.002
Mnd 10	November 2025	373 583 333 kr	374 280 000 kr	373 400 000 kr	1.002	1.002
Mnd 11	Desember 2025	423 241 667 kr	424 140 000 kr	424 100 000 kr	1.000	1.002
Mnd 12	Januar 2026	517 400 000 kr	540 968 333 kr	543 300 000 kr	0.996	1.046

Mnd 13 ← Statusdato	Februar 2026	611 558 333 kr	638 456 667 kr	638 400 000 kr	1.000	1.044
Mnd 14	Mars 2026	708 216 667 kr	—	—	—	—
Mnd 15	April 2026	785 875 000 kr	—	—	—	—
Mnd 16	Mai 2026	800 000 000 kr	—	—	—	—
