

# Månedlig prosjektstyringsrapport

4-ukers rapportmal for baseline, opptjent verdi, avvik, risiko og S-kurve-rapportering

|                   |                                           |                    |                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Prosjekt          | Nye Hædda Barneskole                      | Rapporteringsmåned | Februar 2025                                                     |
| Prosjektleder     | Gruppe irgesundinger                      | Statusdato         | 28.02.2025                                                       |
| Sponsor / kunde   | Hædda kommune<br>(kommunestyret)          | Rapportversjon     | v1.0                                                             |
| Utarbeidet av     | Prosjektledelsen, Nye<br>Hædda Barneskole | Valuta             | kr                                                               |
| Overordnet status | Grønn                                     | Distribusjon       | Byggekomiteen,<br>prosjekteier,<br>byggherreombud,<br>teamledere |

## 1. Hoved-KPI-er

Ved statusdato 28.02.2025 (slutten av Februar 2025) har prosjektet et opptjent verdi (EV) på 24.5 MNOK (3.1 % av BAC på 800 MNOK), med en faktisk kostnad (AC) på 24.2 MNOK og planlagt verdi (PV) på 20.8 MNOK. CPI på 1.012 viser at prosjektet er innenfor budsjett, mens SPI på 1.176 viser at prosjektet er forut for plan. Estimert sluttcost (EAC) er 790.5 MNOK, som gir en variance at completion (VAC) på +9.5 MNOK mot vedtatt BAC. Overordnet status: Grønn.

### KPI-sammendrag for hele prosjektet

| KPI                                  | Verdi                                     | KPI                                    | Verdi                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| BAC                                  | 800 000 000 kr                            | PV (kum.)                              | 20 825 000 kr                            |
| EV (kum.)                            | 24 490 000 kr                             | AC (kum.)                              | 24 200 000 kr                            |
| CPI                                  | 1.012                                     | SPI                                    | 1.176                                    |
| EAC                                  | 790 526 746 kr                            | ETC                                    | 766 326 746 kr                           |
| VAC                                  | 9 473 254 kr                              | Godkjent risikoreserve /<br>tidsbuffer | 50 000 000 kr / 8 uker                   |
| Brukt / gjenværende<br>risikoreserve | Brukt 0 kr / Gjenværende<br>50 000 000 kr | Brukt / gjenværende<br>tidsbuffer      | Brukt 0.0 uker /<br>Gjenværende 8.0 uker |

### KPI-visning per milepæl

| Milepæl /<br>arbeidsstrøm                     | BAC              | EV               | AC               | CPI   | SPI   | ETC              | VAC           | Status /<br>merknad |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|
| 1.<br>Prosjektledelse<br>og<br>Administrasjon | 25 000<br>000 kr | 1 570 000<br>kr  | 1 551 409<br>kr  | 1.012 | 0.947 | 23 430<br>000 kr | 296 039<br>kr | På plan             |
| 2. Planlegging og<br>Prosjektering            | 70 000<br>000 kr | 22 920<br>000 kr | 22 648<br>591 kr | 1.012 | 1.196 | 47 080<br>000 kr | 828 910<br>kr | På plan             |

|                                         |                |      |      |   |   |                |      |              |
|-----------------------------------------|----------------|------|------|---|---|----------------|------|--------------|
| 3. Forberedelse og Riving               | 70 000 000 kr  | 0 kr | 0 kr | — | — | 70 000 000 kr  | 0 kr | Ikke startet |
| 4. Skolebygg – Bygningsmessige arbeider | 360 000 000 kr | 0 kr | 0 kr | — | — | 360 000 000 kr | 0 kr | Ikke startet |
| 5. Skolebygg – Tekniske Anlegg          | 150 000 000 kr | 0 kr | 0 kr | — | — | 150 000 000 kr | 0 kr | Ikke startet |
| 6. Utomhus og Uteområder                | 25 000 000 kr  | 0 kr | 0 kr | — | — | 25 000 000 kr  | 0 kr | Ikke startet |
| 7. Inventar og Utstyr (FF&E)            | 70 000 000 kr  | 0 kr | 0 kr | — | — | 70 000 000 kr  | 0 kr | Ikke startet |
| 8. Overtakelse og Avslutning            | 30 000 000 kr  | 0 kr | 0 kr | — | — | 30 000 000 kr  | 0 kr | Ikke startet |

## 2. Baseline- og oppfølgings-Gantt-diagram

Figur 1 viser Baseline 1 (godkjent etter komprimering av 4.1 Råbygg iht. kommunestyrets vedtak NHB-IRGESUND) sammen med faktisk fremdrift pr. statusdato 28.02.2025. Eksporteres fra MS Project og settes inn under (Gantt — Tracking-visning med baseline + faktisk-stolper).

[FIGUR 1 — settes inn manuelt: Tracking-Gantt fra MS Project, statusdato 28.02.2025. Vis Baseline 1-stolper sammen med faktisk fremdrift. Marker statusdato med dagens linje.]

## 3. Avvik i perioden og hvordan de ble løst

Ingen vesentlige avvik registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan, og bruk av risikoreserve og tidsbuffer er uendret denne måneden. Tidligere registrerte hendelser følges opp iht. fastsatte frister.

| ID | Avvik                                        | Konsekvens | Løsning / korrigerende tiltak | Ansvarlig | Lukket den | Status |
|----|----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|------------|--------|
| —  | Ingen vesentlige avvik registrert i perioden | —          | —                             | —         | —          | Lukket |

## 4. Risikoer og bruk av risikobudsjettet

Brukt risikoreserve hittil: 0.0 MNOK av godkjent 50 MNOK (0.0 %). Brukt tidsbuffer hittil: 0.0 uker av godkjent 8 uker (0.0 %). Antall hendelser med registrert respons hittil: 0 (ingen). Restrisiko vurderes som lav på dette stadiet i prosjektet.


| Risikobudsjettmåltall | Verdi | Risikobudsjettmåltall | Verdi |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|

|                               |               |                                |                    |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| Godkjent reserve (kr)         | 50 000 000 kr | Brukt til nå                   | 0 kr               |
| Gjenværende reserve (kr)      | 50 000 000 kr | Åpne høye risikoer             | 3 (av registrerte) |
| Godkjent tidsbuffer (uker)    | 8 uker        | Brukt tidsbuffer til nå (uker) | 0.0 uker           |
| Gjenværende tidsbuffer (uker) | 8.0 uker      | Risikoreserve som % av BAC     | 6.2 %              |

| ID | Risiko                                     | Sannsynlighet | Konsekvens | Tiltak / respons | Brukt budsjett | Brukt budsjett | Status |
|----|--------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------------|----------------|--------|
| —  | Ingen risikoer har utløst respons så langt | —             | —          | —                | —              | —              | —      |

### 5. S-kurve og analyse av opptjent verdi

S-kurven nedenfor viser kumulativ PV, EV og AC for hele prosjektforløpet (mnd 1–16), med statuslinje ved mnd 1 (Februar 2025). Prosjektet er 3.1 % fullført målt i opptjent verdi. CPI på 1.012 indikerer innenfor budsjett, og SPI på 1.176 indikerer at prosjektet er forut for plan. Den høye SPI tidlig i prosjektet skyldes at detaljprosjektering (2.1) ble fullført raskere enn lineær fordeling tilsier — en planlagt frontlasting av planleggingsfasen.

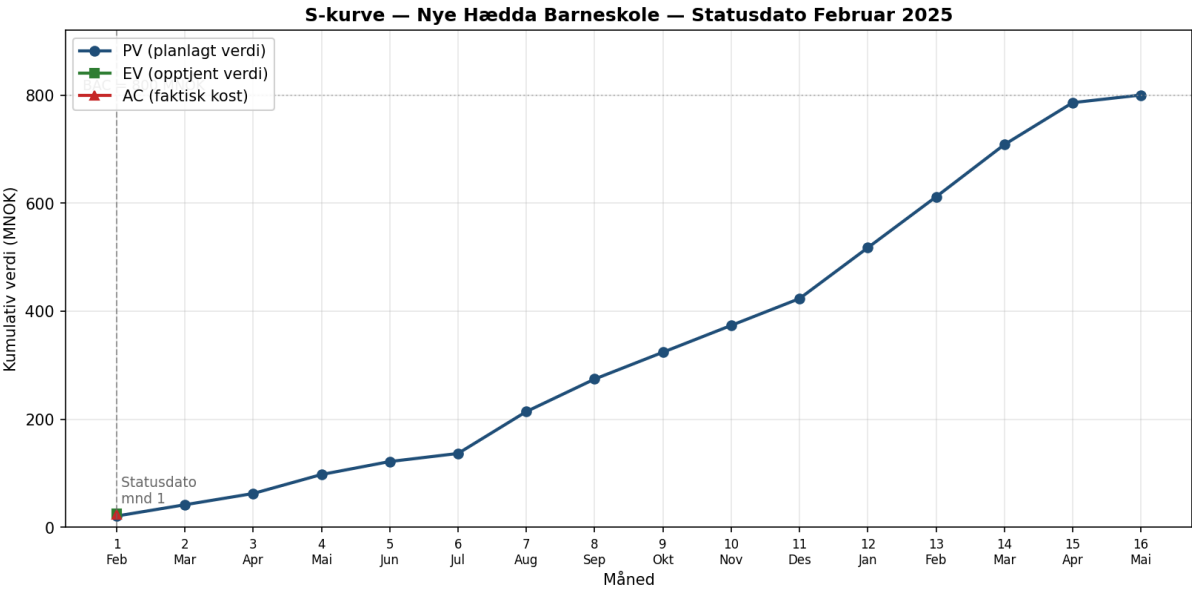

### Støttende datatabell

Datatabellen under viser kumulative prosjektverdier per måned for hele forløpet. Statusdato er markert med ← Statusdato i raden for mnd 1. Fremtidige måneder viser bare planlagt PV; EV/AC/CPI/SPI fylles ut etter hvert som statusrapportene leveres.

| Måned              | Periode / dato | PV kum. (kr)  | EV kum. (kr)  | AC kum. (kr)  | CPI   | SPI   |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| Mnd 1 ← Statusdato | Februar 2025   | 20 825 000 kr | 24 490 000 kr | 24 200 000 kr | 1.012 | 1.176 |
| Mnd 2              | Mars 2025      | 41 650 000 kr | —             | —             | —     | —     |

|        |                |                |   |   |   |   |
|--------|----------------|----------------|---|---|---|---|
| Mnd 3  | April 2025     | 62 475 000 kr  | — | — | — | — |
| Mnd 4  | Mai 2025       | 97 633 333 kr  | — | — | — | — |
| Mnd 5  | Juni 2025      | 121 625 000 kr | — | — | — | — |
| Mnd 6  | Juli 2025      | 136 616 667 kr | — | — | — | — |
| Mnd 7  | August 2025    | 214 108 333 kr | — | — | — | — |
| Mnd 8  | September 2025 | 274 266 667 kr | — | — | — | — |
| Mnd 9  | Oktober 2025   | 323 925 000 kr | — | — | — | — |
| Mnd 10 | November 2025  | 373 583 333 kr | — | — | — | — |
| Mnd 11 | Desember 2025  | 423 241 667 kr | — | — | — | — |
| Mnd 12 | Januar 2026    | 517 400 000 kr | — | — | — | — |
| Mnd 13 | Februar 2026   | 611 558 333 kr | — | — | — | — |
| Mnd 14 | Mars 2026      | 708 216 667 kr | — | — | — | — |
| Mnd 15 | April 2026     | 785 875 000 kr | — | — | — | — |
| Mnd 16 | Mai 2026       | 800 000 000 kr | — | — | — | — |
