

Månedlig prosjektstyringsrapport

4-ukers rapportmal for baseline, opptjent verdi, avvik, risiko og S-kurve-rapportering

Prosjekt	Nye Hædda Barneskole	Rapporteringsmåned	Mars 2025
Prosjektleder	Gruppe Gruppe 4.5	Statusdato	31.03.2025
Sponsor / kunde	Hædda kommune (kommunestyret)	Rapportversjon	v1.0
Utarbeidet av	Prosjektledelsen, Nye Hædda Barneskole	Valuta	kr
Overordnet status	Grønn	Distribusjon	Byggekomiteen, prosjekteier, byggherreombud, teamledere

1. Hoved-KPI-er

Ved statusdato 31.03.2025 (slutten av Mars 2025) har prosjektet et opptjent verdi (EV) på 52.2 MNOK (6.5 % av BAC på 800 MNOK), med en faktisk kostnad (AC) på 52.1 MNOK og planlagt verdi (PV) på 41.6 MNOK. CPI på 1.002 viser at prosjektet er innenfor budsjett, mens SPI på 1.254 viser at prosjektet er forut for plan. Estimert sluttcost (EAC) er 798.3 MNOK, som gir en variance at completion (VAC) på +1.7 MNOK mot vedtatt BAC. Overordnet status: Grønn.

KPI-sammendrag for hele prosjektet

KPI	Verdi	KPI	Verdi
BAC	800 000 000 kr	PV (kum.)	41 650 000 kr
EV (kum.)	52 210 000 kr	AC (kum.)	52 100 000 kr
CPI	1.002	SPI	1.254
EAC	798 314 499 kr	ETC	746 214 499 kr
VAC	1 685 501 kr	Godkjent risikoreserve / tidsbuffer	50 000 000 kr / 8 uker
Brukt / gjenværende risikoreserve	Brukt 0 kr / Gjenværende 50 000 000 kr	Brukt / gjenværende tidsbuffer	Brukt 0.0 uker / Gjenværende 8.0 uker

KPI-visning per milepæl

Milepæl / arbeidsstrøm	BAC	EV	AC	CPI	SPI	ETC	VAC	Status / merknad
1. Prosjektledelse og Administrasjon	25 000 000 kr	3 330 000 kr	3 322 984 kr	1.002	1.004	21 670 000 kr	52 672 kr	På plan
2. Planlegging og Prosjektering	70 000 000 kr	48 880 000 kr	48 777 016 kr	1.002	1.275	21 120 000 kr	147 481 kr	På plan

3. Forberedelse og Riving	70 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	70 000 000 kr	0 kr	Ikke startet
4. Skolebygg – Bygningsmessige arbeider	360 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	360 000 000 kr	0 kr	Ikke startet
5. Skolebygg – Tekniske Anlegg	150 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	150 000 000 kr	0 kr	Ikke startet
6. Utomhus og Uteområder	25 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	25 000 000 kr	0 kr	Ikke startet
7. Inventar og Utstyr (FF&E)	70 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	70 000 000 kr	0 kr	Ikke startet
8. Overtakelse og Avslutning	30 000 000 kr	0 kr	0 kr	—	—	30 000 000 kr	0 kr	Ikke startet

2. Baseline- og oppfølgings-Gantt-diagram

Figur 1 viser Baseline 1 (godkjent etter komprimering av 4.1 Råbygg iht. kommunestyrets vedtak NHB-2026-15) sammen med faktisk fremdrift pr. statusdato 31.03.2025. Eksporteres fra MS Project og settes inn under (Gantt — Tracking-visning med baseline + faktisk-stolper).

[FIGUR 1 — settes inn manuelt: Tracking-Gantt fra MS Project, statusdato 31.03.2025. Vis Baseline 1-stolper sammen med faktisk fremdrift. Marker statusdato med dagens linje.]

3. Avvik i perioden og hvordan de ble løst

Ingen vesentlige avvik registrert i perioden. Aktive risikoer overvåkes iht. risikoplan, og bruk av risikoreserve og tidsbuffer er uendret denne måneden. Tidligere registrerte hendelser følges opp iht. fastsatte frister.

ID	Avvik	Konsekvens	Løsning / korrigerende tiltak	Ansvarlig	Lukket den	Status
—	Ingen vesentlige avvik registrert i perioden	—	—	—	—	Lukket

4. Risikoer og bruk av risikobudsjettet

Brukt risikoreserve hittil: 0.0 MNOK av godkjent 50 MNOK (0.0 %). Brukt tidsbuffer hittil: 0.0 uker av godkjent 8 uker (0.0 %). Antall hendelser med registrert respons hittil: 0 (ingen). Restrisiko vurderes som lav på dette stadiet i prosjektet.


Risikobudsjettmåltall	Verdi	Risikobudsjettmåltall	Verdi
-----------------------	-------	-----------------------	-------

Godkjent reserve (kr)	50 000 000 kr	Brukt til nå	0 kr
Gjenværende reserve (kr)	50 000 000 kr	Åpne høye risikoer	3 (av registrerte)
Godkjent tidsbuffer (uker)	8 uker	Brukt tidsbuffer til nå (uker)	0.0 uker
Gjenværende tidsbuffer (uker)	8.0 uker	Risikoreserve som % av BAC	6.2 %

ID	Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Tiltak / respons	Brukt budsjett	Brukt budsjett	Status
—	Ingen risikoer har utløst respons så langt	—	—	—	—	—	—

5. S-kurve og analyse av opptjent verdi

S-kurven nedenfor viser kumulativ PV, EV og AC for hele prosjektforløpet (mnd 1–16), med statuslinje ved mnd 2 (Mars 2025). Prosjektet er 6.5 % fullført målt i opptjent verdi. CPI på 1.002 indikerer innenfor budsjett, og SPI på 1.254 indikerer at prosjektet er forut for plan. Den høye SPI tidlig i prosjektet skyldes at detaljprosjektering (2.1) ble fullført raskere enn lineær fordeling tilsier — en planlagt frontlasting av planleggingsfasen.

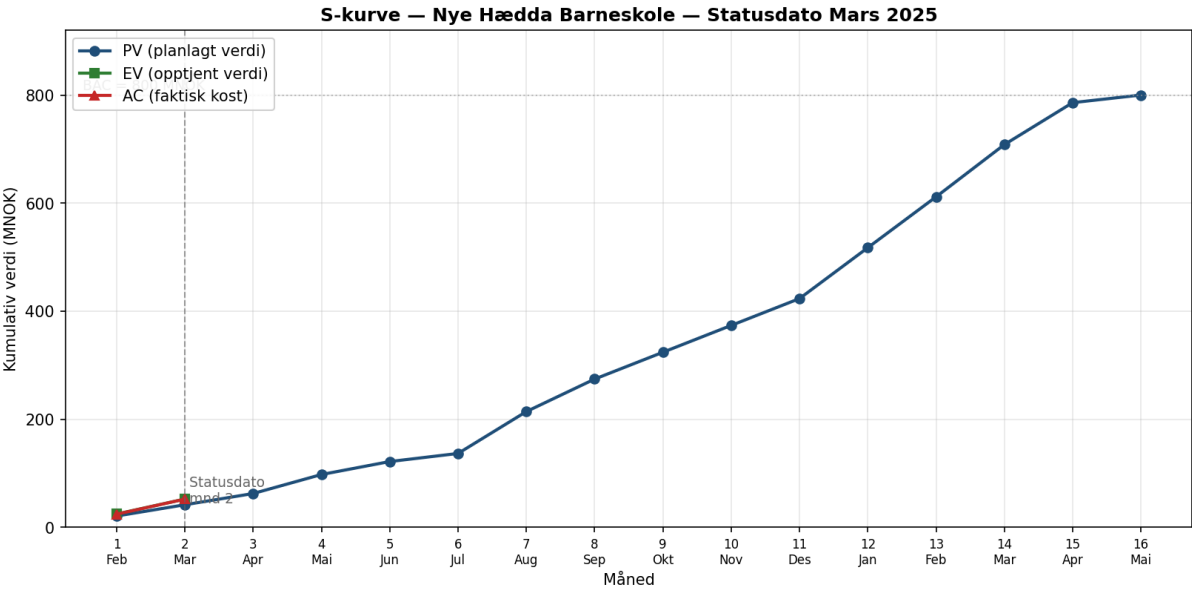

Støttende datatabell

Datatabellen under viser kumulative prosjektverdier per måned for hele forløpet. Statusdato er markert med ← Statusdato i raden for mnd 2. Fremtidige måneder viser bare planlagt PV; EV/AC/CPI/SPI fylles ut etter hvert som statusrapportene leveres.

Måned	Periode / dato	PV kum. (kr)	EV kum. (kr)	AC kum. (kr)	CPI	SPI
Mnd 1	Februar 2025	20 825 000 kr	24 490 000 kr	24 200 000 kr	1.012	1.176
Mnd 2 ← Statusdato	Mars 2025	41 650 000 kr	52 210 000 kr	52 100 000 kr	1.002	1.254

Mnd 3	April 2025	62 475 000 kr	—	—	—	—
Mnd 4	Mai 2025	97 633 333 kr	—	—	—	—
Mnd 5	Juni 2025	121 625 000 kr	—	—	—	—
Mnd 6	Juli 2025	136 616 667 kr	—	—	—	—
Mnd 7	August 2025	214 108 333 kr	—	—	—	—
Mnd 8	September 2025	274 266 667 kr	—	—	—	—
Mnd 9	Oktober 2025	323 925 000 kr	—	—	—	—
Mnd 10	November 2025	373 583 333 kr	—	—	—	—
Mnd 11	Desember 2025	423 241 667 kr	—	—	—	—
Mnd 12	Januar 2026	517 400 000 kr	—	—	—	—
Mnd 13	Februar 2026	611 558 333 kr	—	—	—	—
Mnd 14	Mars 2026	708 216 667 kr	—	—	—	—
Mnd 15	April 2026	785 875 000 kr	—	—	—	—
Mnd 16	Mai 2026	800 000 000 kr	—	—	—	—
