

Bygg perfekt Gantt

Nye Hædda barneskole — guide for norsk MS Project

Tidsforbruk: ~30 min hvis alt går smertefritt, ~60 min med visuell finpussing.

Forutsetninger: Norsk MS Project er installert. Filer ligger i Arbeidsfiler/.

Mål: A-nivå Gantt + grunnlag for sporing i fase 3 — totalt 22 sensor-poeng.

Konvensjon: Norske menynavn først, engelske i parentes ved første bruk per seksjon.

Oppdatert: 12.05.2026 — erstatter engelsk versjon.

Hva sensoren leter etter (sensorveiledningens A-krav)

Hva sensoren leter etter i Gantt-en (12 poeng)



Stolper
følger
tidsaksen



Kritisk linje
markert i
rødt



Milepæler
synlige
(◆)



Basisplan 0
satt



Tall matcher
Bårds
simulering


Sensorveiledningen krever: *'Realistisk fremdriftsplan, gode milepæler, riktig bruk av basisplan og troverdig statussporing.'* Denne guiden tar deg gjennom alle 5 punktene.

Innhold

Steg	Hva	Tid
1	Åpne import-fila i MS Project	2 min
2	Importveiviser (5 valg)	3 min
3	Sett prosjektets startdato	1 min
4	Verifiser at importen er korrekt	3 min
5	Aktiver kritisk linje	1 min
6	Visuell finpussing (4 deler)	10 min
7	Sett Basisplan 0	1 min
8	Lagre som .mpp	1 min
9	Eksporter Gantt som bilde	5 min
10	Kvalitetssjekk mot sensorveiledning	5 min
11	Etter du er ferdig — neste steg	—
Bilag A	Forventet sluttresultat (preview)	
Bilag B	Vanlige problemer + løsninger	

Komplett arbeidsflyt

Komplett arbeidsflyt — 10 steg fra Excel til ferdig Gantt

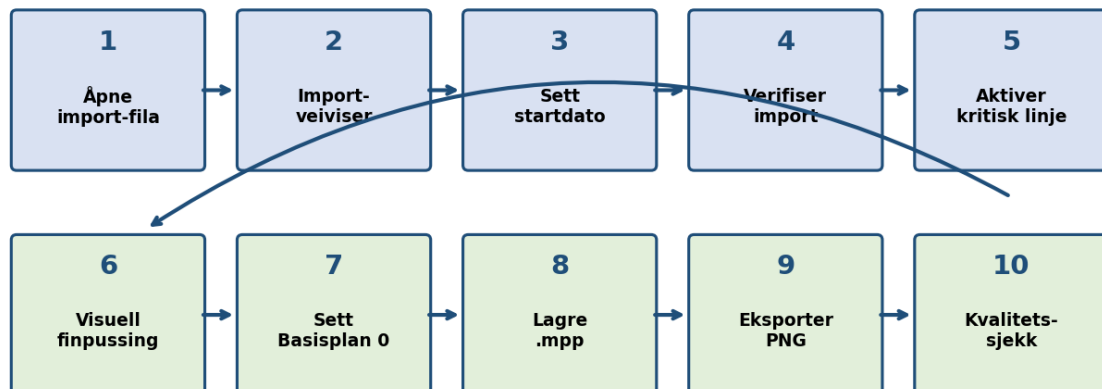

STEG 1 Åpne import-fila i MS Project

1. Start **Microsoft Project**.
2. **Fil** → **Åpne** → **Bla gjennom** (*File* → *Open* → *Browse*).
3. Bla deg frem til:

C:\Users\Gusta\OneDrive\...\LOG565 - Prosjektledelse\Arbeidsfiler\

4. KRITISK: Endre filtype-dropdown nederst til høyre fra *Prosjektfiler* til **Excel-arbeidsbok (*.xlsx)** — ellers ser du ikke fila.

5. Velg **Gantt-import (Bårds simulering) - Nye Hædda barneskole.xlsx** → **Åpne**.

Steg 1 — Fil → Åpne (husk å bytte filtype!)



STEG 2 Importveiviser (5 valg)

Skjerm (norsk)	Valg	Engelsk navn
Velkommen	Neste	Welcome
Tilordning	Velg Ny tilordning → Neste	Map → New map
Importmodus	Velg Som nytt prosjekt → Neste	Import mode → As a new project
Tilordningsalternativer	Huk av Oppgaver + Importen inneholder overskrifter	Map Options → Tasks + headers
Tilordning av oppgaver	Sjekk at alle 8 kolonner er mappet (se under)	Task Mapping
Fullfør	Fullfør	Finish

Forventet kolonne-mapping

Steg 2 — Forventet kolonne-mapping i Importveiviseren

Excel-kolonne	→	MS Project-felt (norsk)
ID	→	ID
WBS	→	WBS
Outline Level	→	Disposisjonsnivå
Name	→	Navn
Duration	→	Varighet
Predecessors	→	Foregangsoppgaver
Cost	→	Kostnad (eller Fast kostnad)
Resource Names	→	Ressursnavn

Hvis **Kostnad** ikke kan velges: bruk **Fast kostnad** (*Fixed Cost*) i stedet. Det fungerer identisk for vår bruk.

STEG 3 Sett prosjektets startdato (KRITISK)

Etter import vises Gantt'en med datoer som starter fra 'I dag'. Vi må endre.

1. **Prosjekt**-fanen → **Prosjektinformasjon** (*Project* → *Project Information*)
2. **Startdato:** 01.02.2025
3. **Kalender:** Standard
4. **OK**

Steg 3 — Prosjektinformasjon (sett startdato)

Prosjektinformasjon for 'Prosjekt1'

Startdato:	01.02.2025
Sluttdato:	(beregnes automatisk)
Planlegg fra:	Prosjektets startdato
Gjeldende dato:	(dagens dato)
Statusdato:	I/T
Kalender:	Standard

OK

MÅ settes til 01.02.2025

Skal være Standard

MS Project rekalkulerer alle datoer. **Forventet sluttdato:** rundt 31. juli 2026.

STEG 4 Verifiser at importen er korrekt

Før du går videre, sjekk at disse tallene stemmer.

Steg 4 — Sjekkpunkter etter import (forventede verdier)

✓	Antall oppgaver 44	(40 aktiviteter + 4 milepæler)
✓	Sluttdato ~31. juli 2026	(~6 uker over hard frist 15. mai)
✓	Total kostnad 750 000 000 kr	(750 mill — ~50 mill over ramme)
✓	Antall milepæler ♦ 4	(BP2, BP3, FRIST, SKOL)
✓	Kritisk linje synlig Ja	(røde stolper langs 2→3→4.1→5→8)

Hvis sluttdato er VESENTLIG annerledes enn juli 2026: noe gikk galt med Foregangsoppgaver-mappingen. Tilbake til Steg 2.


Tips: Prosjekt → Prosjektinformasjon → Statistikk (Statistics) gir deg alle nøkkeltallene i ett vindu.

STEG 5 Aktiver kritisk linje (rødt-markering)

Sensorveiledningen krever 'realistisk fremdriftsplan'. Kritisk linje viser hvilke aktiviteter som driver sluttdatoen.

1. **Format**-fanen (vises kun i Gantt-visning).
2. Huk av **Kritiske oppgaver** (*Critical Tasks*).
3. Røde stolper = kritisk linje.

Steg 5 – Slik skal kritisk linje se ut (rødt = kritisk)

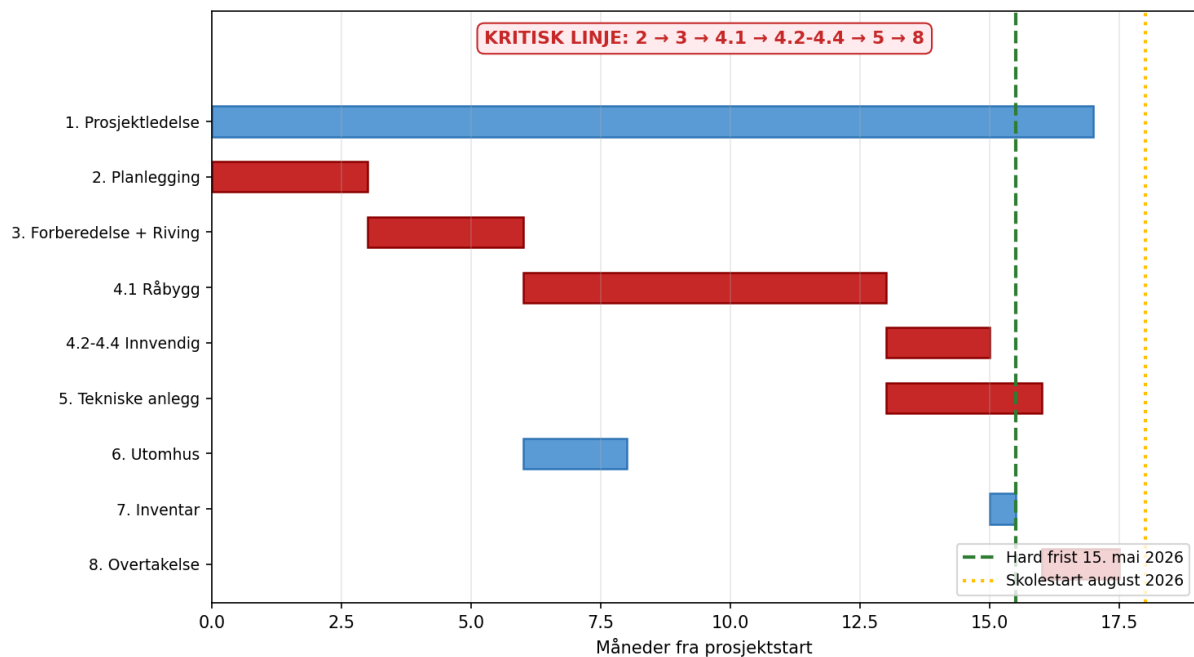

Hvis ingen stolper er røde: sjekk at Foregangsoppgaver er importert. Uten avhengigheter er INGEN aktiviteter kritiske.

STEG 6 Visuell finpussing

Disse stegene er forskjellen mellom 'OK Gantt' og 'A-Gantt'.

6a) Milepæler skal være tydelige

Klikk milepæl-rad (BP2, BP3, FRIST, SKOL). Sjekk at de vises som **diamantsymboler** ♦. Ellers: høyreklikk → **Oppgaveinformasjon** → **Avansert** (*Task Information* → *Advanced*) → **Merk oppgave som milepæl** (*Mark task as milestone*) → OK.

6b) Tidslinjen øverst

Visning-fanen (*View*) → huk av **Tidslinje** (*Timeline*). Høyreklikk i Tidslinjen → **Legg til oppgave på tidslinjen** (*Add Task to Timeline*) → velg de 4 milepælene + 1–3 hovedfaser.

6c) Vis kostnader i tabellen

Visning → **Tabeller** → **Kostnad** (*View* → *Tables* → *Cost*). **Total kostnad nederst skal være 750 000 000 kr.**

6d) Sett frist-markør på 15. mai 2026

Aktivitet 35 (Overtakelse). Høyreklikk → **Oppgaveinformasjon** → **Avansert** → **Frist** (*Deadline*): 15.05.2026. Grønn pil markerer hard frist.

Disse 4 finpussingene tar 5–10 min og gir 2–3 ekstra poeng på 'Sporbarhet og profesjonalitet'.

STEG 7 Sett Basisplan 0 (LÅSER PLANEN)

Dette er hjertet i sensorveiledningen — uten basisplan ingen sporbar endring.

1. **Prosjekt** → **Angi basisplan** → **Angi basisplan...** (*Project* → *Set Baseline* → *Set Baseline*)
2. Angi basisplan: **Basisplan** (*Baseline*) — det er Basisplan 0 i UI
3. For: **Hele prosjektet** (*Entire project*)
4. **OK**

Steg 7 — Angi basisplan (Basisplan 0)

Angi basisplan ×

● **Angi basisplan** Basisplan ▼

☐ Angi midlertidig plan

For:

☒ ● **Hele prosjektet**

☐ Valgte oppgaver

OK

Velg 'Basisplan' (= Basisplan 0)

Basisplan 0 bevares automatisk når du senere setter Basisplan 1 etter crashing — det er sentralt for 'Endringsstyring' (8 sensorpoeng).

STEG 8 Lagre som .mpp

1. **Fil** → **Lagre som** → **Bla gjennom**
2. Naviger til: 02 - Planlegging\
3. **Filnavn:** Gantt - Nye Hædda barneskole.mpp
4. **Lagre**

STEG 9 Eksporter Gantt som bilde

Vi trenger PNG av Gantt'en for komplett prosjektplan-PDF og månedsrapporter.

Metode A: Skjermutklipp (enklest)

1. **Visning** → **Zoom** → **Hele prosjektet**
2. Maksimer MS Project-vinduet
3. **Skjermutklipp** (*Snipping Tool*) — Win+Shift+S
4. Snip → Paint → Lagre som PNG
5. **Filnavn:** Gantt - Baseline 0 - Opprinnelig estimat.png
6. **Lagre i:** 02 - Planlegging\

Metode B: MS Project-eksport (penere)

Fil → **Eksporter** → **Lagre prosjekt som fil** → **PDF**. Konverter PDF til PNG ved behov.

STEG 10 Kvalitetssjekk mot sensorveiledningen

Gå gjennom denne sjekklista FØR du regner Gantt'en som ferdig:

Steg 10 – Kvalitetssjekk: 11 punkter mot sensorveiledningens A-krav

- ☐ 1. Sluttdato ~juli 2026 (Prosjekt → Prosjektinformasjon → Statistikk)
- ☐ 2. Total kostnad ~750 mill kr
- ☐ 3. Kritisk linje aktivert (røde stolper)
- ☐ 4. Minst 4 milepæler synlige (◆)
- ☐ 5. Foregangsoppgaver gir piler mellom oppgaver
- ☐ 6. Hovedgrener er sammendragstolper (svarte/tykke)
- ☐ 7. Ressurser vist for hver oppgave
- ☐ 8. Frist-markør på Overtakelse (15.05.2026)
- ☐ 9. Basisplan 0 satt (Prosjekt → Angi basisplan)
- ☐ 10. Lagret som .mpp i `02 - Planlegging/`
- ☐ 11. PNG eksportert til `02 - Planlegging/`

Når alle 11 er ✓ → Gantt'en er A-nivå-klar (12 poeng).

STEG 11 Etter du er ferdig — neste steg

Si til Claude: 'Gantt er bygget — Basisplan 0 er satt, sluttdato XX, total kostnad YY mill kr.'

Da gjør jeg disse tingene automatisk:

- Oppdaterer **Komplett prosjektplan-PDF** med konkrete tall
- Oppdaterer **INNLEVERINGSOVERSIKT.md** (Gantt 2.6 → ferdig)
- Forbereder fase 3 + Basisplan 1 etter Bårds crashing-instruks


Når Bård sender crashing-instruks via Teams:

1. Endre varigheten på Bårds spesifiserte aktivitet
2. Oppdater kostnaden
3. Sett **Basisplan 1** (NB: ikke overskriv Basisplan 0!)
4. Eksporter ny PNG: Gantt - Baseline 1 - Etter crashing.png

Detaljert prosess: se 03 - Gjennomføring/MS_PROJECT_BASELINE_STRATEGI.md

Bilag A — Forventet sluttresultat

Slik skal Gantt'en din se ut i grove trekk når Basisplan 0 er satt. Dette er en matplotlib-generert visualisering basert på Bårds simulerte tall.

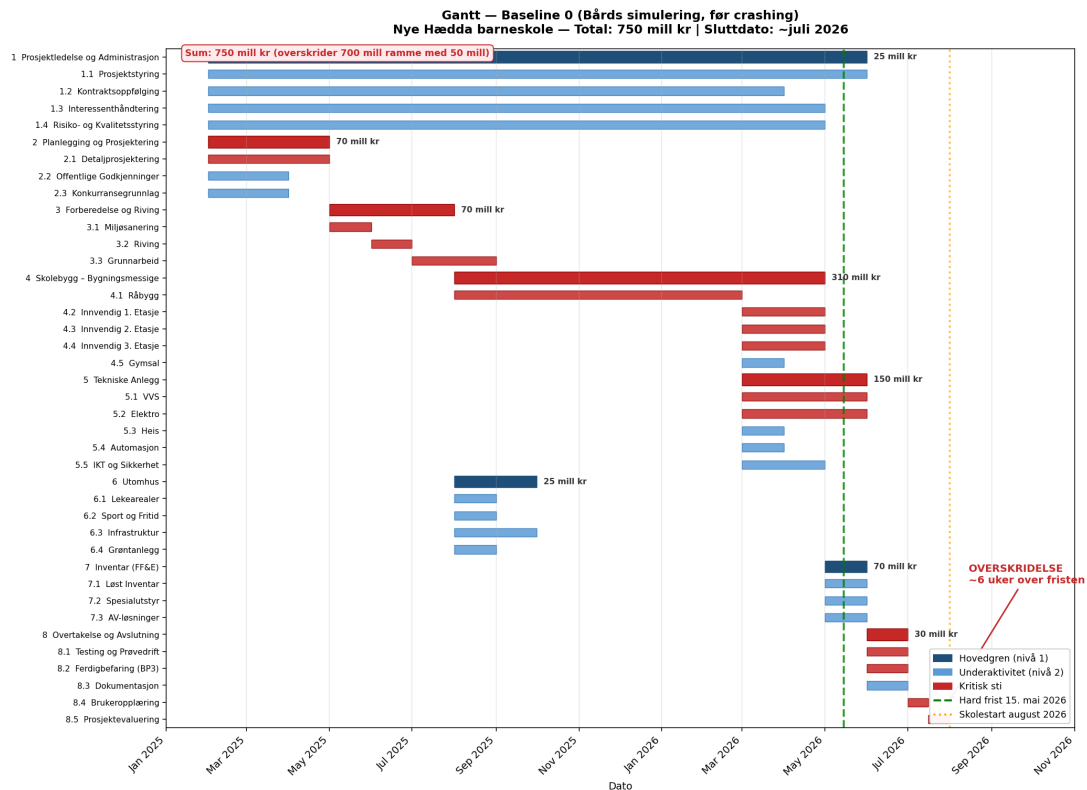

Nøkkelegenskaper å se etter:

- Prosjektet starter februar 2025
- Kritisk linje (rødt) går fra Planlegging gjennom Råbygg til Overtakelse
- Sluttdato lander i juli 2026 — overskrider hard frist 15. mai 2026 med ~6 uker
- Total kostnad 750 mill kr — overskrider 700 mill ramme med 50 mill
- Begge overskridelsene løses av crashing senere (Basisplan 1)

Bilag B — Vanlige problemer + løsninger

Problem	Løsning
Importen feilet — Kostnad-kolonnen kan ikke mappes	Velg Fast kostnad (<i>Fixed Cost</i>) i stedet.
Sluttdato ble januar 2026 (ikke juli 2026)	Foregangsoppgaver ble ikke importert. Tilbake til Steg 2.
Alle aktiviteter starter samme dag	Foregangsoppgaver mangler ELLER startdato er feil. Sjekk Steg 3.
Ingen kostnader vises	Kostnad-kolonnen ble mappet til Fast kostnad. Visning → Tabeller → Kostnad .
Disposisjonsnivå fungerer ikke — alle på samme nivå	Marker nivå 2-aktivitetene → Oppgave -fanen → Innrykk (<i>Indent</i>).
MS Project åpner ikke .xlsx	Sjekk at filtype-dropdown er Excel-arbeidsbok (ikke <i>Prosjektfiler</i>).
Milepæler vises som vanlige stolper (ikke ♦)	Høyreklikk → Oppgaveinformasjon → Avansert → Merk oppgave som milepæl → OK.
Kritisk linje har ingen røde stolper	Foregangsoppgaver mangler. Også: Format -fanen → Kritiske oppgaver må være på.

Hvis noe annet går galt: send Claude et skjermbilde + en kort beskrivelse, så finstiller vi sammen.

Lykke til, Gustavo. Du har 22 sensor-poeng innen rekkevidde — bare følg stegene.

GANTT_BYGGE_GUIDE_NORSK.pdf — norsk versjon, oppdatert 12.05.2026

Markdown-versjon: 02 - Planlegging/GANTT_BYGGE_GUIDE.md
